

ARDINA

Associação Cultural de Jovens de Cambeses

Jan/Fev/Mar 2013

Conteúdos

Nota Introdutória.....	3
FASE A - Limpeza e Despedrega	4
FASE B - Implantações Planimétricas.....	5
FASE C - Início dos trabalhos de construção.....	7
FASE D -Trabalhos de Plantação/Limpeza/Consolidação -Lago Naturalizado.....	21
FASE E - continuação dos trabalhos de construção - Alojamento Lago.....	29

Nota Introdutória

O projeto de valorização e integração paisagística do espaço envolvente à sede da associação Ardina, assume a designação de Vila Cova Green Nature.

A proposta de intervenção tem por base fortes conceitos de sustentabilidade em todas as suas vertentes, ambiental, social e económico financeira surgindo o conceito destas mesmas premissas.

Vila Cova Geen Nature engloba distintas funções e ambiências, todas elas em conformidade e equilíbrio, não descurando o “genius loci” do local e enfatizando as suas potencialidades.

Apresenta-se o relatório correspondente à primeira fase de trabalhos no local.

ARQ. PAISAGISTA

CALILA RIBEIRO DA PONTE

FASE A - Limpeza e Despedrega

Dia 1 - 28 Janeiro de 2013

Início de trabalhos no interior do Moinho de Negreiro de forma a colmatar a infiltração existente. Medição para a implementação de um pequeno móvel de cozinha e colocação de uma prateleira existente no WC.



28-01-2013 Início de Limpeza e Despedrega - Local de implantação de Alojamento Lago



28-01-2013 Início de Limpeza e Despedrega - Local de implantação de Alojamento Lago



28-01-2013 Início de Limpeza e Despedrega - Local de implantação de Alojamento Lago



28-01-2013 Início de Limpeza e Despedrega - Local de implantação de Alojamento Lago

FASE B - Implantações Planimétricas

Dia 2 - 29 Janeiro de 2013

Início de limpeza e despedrega da área correspondente ao lago a naturalizar. Formalização da morfologia do lago. Marcação da localização do alojamento lago.



29-01-2013 Limpeza Despedrega e Formalização do Lago Naturalizado



29-01-2013 Limpeza Despedrega e Formalização do Lago Naturalizado



29-01-2013 Início da implantação planimétrica do Alojamento Lago



29-01-2013 Início da implantação planimétrica do Alojamento Lago



29-01-2013 Início da implantação planimétrica do Alojamento Lago

FASE C - Início dos trabalhos de construção

Dia 3 - 30 Janeiro de 2013

Continuação da formalização e naturalização do lago. Projeção altimétrica do alojamento lago e início de trabalhos associados às fundações do mesmo. Finalização do processo regenerativo da infiltração existente no Moinho Negroiro.




30-01-2013 Evolução da implantação planimétrica do Alojamento Lago



30-01-2013 Evolução da implantação planimétrica do Alojamento Lago



30-01-2013 Pretensão evolutiva da implantação altimétrica do Alojamento Lago - Vista esquemática em corte

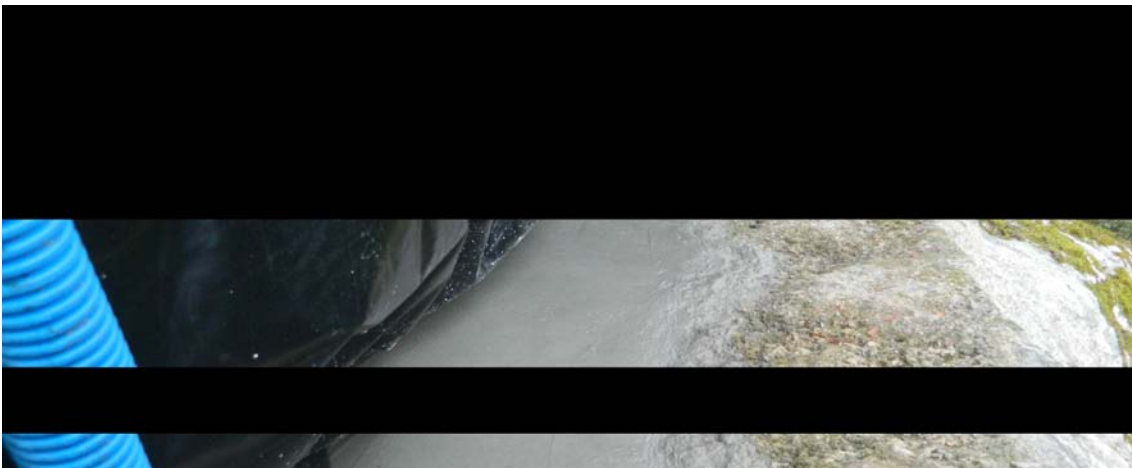

30-01-2013 Colmatação da infiltração no Moinho Negroiro

Dia 4 - 1 Fevereiro de 2013

Progressão da naturalização do lago



30-01-2013 Evolução da Formalização do Lago Naturalizado



01-02-2013 Evolução da Formalização do Lago Naturalizado

Dia 5 - 8 Fevereiro de 2013

Chegada dos elementos vegetais autóctones a plantar, numa primeira fase de execução do projecto de arquitetura paisagista.



08-02-2013 Plantas autóctones

Dia 6 - 27 Fevereiro de 2013

Continuação da construção do Alojamento Lago.



27-02-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago



27-02-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago



27-02-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago

Dia 7 -01 de Março de 2013

Continuação da construção do alojamento lago sendo que no momento a evolução se concentra na zona da cobertura e finalização da esquadria global do elemento.



01-03-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago



01-03-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago

Dia 8 -04 de Março de 2013

Continuação da construção do alojamento lago, formalização da base de assentação do mesmo e detalhes de acabamento da esquadria da cobertura.

Progressão dos trabalhos a nível do elemento de água, consolidando a sua nova forma naturalizada e assumindo a cota pretendida de profundidade.



04-03-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago



04-03-2013 Evolução da naturalização do lago

Dia 9 -05 de Março de 2013

Continuação dos trabalhos no elemento construído, início da limpeza e despedrega do terreno envolvente ao lago.



05-03-2013 Evolução da naturalização do lago



5-03-2013 Evolução da implantação altimétrica do Alojamento Lago

Dia 10 -06 de Março de 2013

Continuação da limpeza e despedrega do terreno.
Colocação da tela impermeabilizante no lago, bem como de elementos inertes implantados em pontos estratégicos; início das plantações junto da margem.



06-03-2013 Continuação da limpeza global do espaço de intervenção



06-03-2013 Continuação da limpeza global do espaço de intervenção



06-03-2013 Colocação da tela impermeabilizante no lago naturalizado



06-03-2013 Colocação da tela impermeabilizante no lago naturalizado



06-03-2013 Colocação de elementos inertes e plantações



06-03-2013 Colocação de elementos inertes e plantações



06-03-2013 Colocação de elementos inertes e plantações





06-03-2013 Colocação de elementos inertes e plantações

Dia 11 -07 de Março de 2013

Continuação da limpeza e despedrega do terreno. Durante este processo pretende-se apenas a reestruturação do habitat natural existente, sendo que são tomadas em conta as espécies a manter e transplantar à posteriori.

Proteção do elemento construído com uma superfície impermeável de forma a prosseguir com os trabalhos(dadas as condições climáticas desfavoráveis).



07-03-2013 Proteção do elemento construído



07-03-2013 Início do assentamento do ripado da base no alojamento lago



07-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



07-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



Dia 12 -08 de Março de 2013

Continuação da limpeza e despedrega do terreno.
Prossecução da implantação do ripado no elemento construído.



07-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



07-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



07-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



07-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



08-03-2013 Continuação da colocação do ripado no elemento construído

FASE D -Trabalhos de Plantação/Limpeza/Consolidação -Lago Naturalizado

Dia 13 -11 de Março de 2013

Remates e consolidação final da estrutura do lago.
Abertura e canalização da passagem de água para o espelho de água.
Continuação da limpeza e despedrega global.



11-03-2013 Redirecionamento da água da ribeira adjacente



11-03-2013 limpeza e consolidação do canal de passagem de água



11-03-2013 Entrada de água no elemento e respetiva canalização



11-03-2013 Detalhe de colocação da tela junto ao afloramento rochoso



11-03-2013 Continuação da limpeza e despedrega



Dia 14 -12 de Março de 2013

Concretização de um filtro (por gravidade), para a entrada de água no lago, que posteriormente será integrado na paisagem através de plantações de espécies nativas e elementos inertes.

Construção da saída de água do elemento de forma a criar uma passagem dinâmica.

Redireccionamento de águas provenientes do regato adjacente para o lago.

Início da formalização da micromodelação proposta.

Continuação da colocação do ripado no elemento construído (devido a condições climatéricas adversas este processo tem vindo a ser dificultado).



2-03-2013 Filtro por gravidade para retenção de impurezas



12-03-2013 Pormenor da entrada de água no lago



12-03-2013 Evolução da entrada de água



12-03-2013 Evolução da saída de água do lago naturalizado



12-03-2013 Remates do espelho de água



12-03-2013 Panorâmica do lago naturalizado



12-03-2013 Vistas globais do elemento de água





12-03-2013 Início da consolidação da micromodelação a implementar



12-03-2013 Continuação dos trabalhos no elemento construído

Dia 15 -13 de Março de 2013

Concretização da micromodelação.
Ajustes de cotas do terreno.



13-03-2013 Construção da micromodelação



13-03-2013 Construção da micromodelação



13-03-2013 Construção da micromodelação

Dia 16 -14 de Março de 2013

Plantação de pequenas herbáceas e bolbos.
Continuação da execução do elemento construído.



14-03-2013 Pequenas herbáceas e bolbos a plantar



14-03-2013 Plantações de bolbos e plantas autóctones



14-03-2013 Plantações de bolbos e plantas autóctones





14-03-2013 Plantações de bolbos e plantas autóctones



14-03-2013 Vista global do lago naturalizado



14-03-2013 Evolução dos trabalhos no alojamento lago



14-03-2013 Evolução dos trabalhos no alojamento lago

FASE E - continuação dos trabalhos de construção - Alojamento Lago

Dia 17 -15 de Março de 2013

Continuação da execução do elemento construído.



15-03-2013 Evolução dos trabalhos no alojamento lago



15-03-2013 Evolução dos trabalhos no alojamento lago

Dia 18 -20 de Março de 2013

Continuação da execução do elemento construído.



15-03-2013 Evolução dos trabalhos no alojamento lago





20-03-2013 Evolução dos trabalhos no alojamento lago, impermeabilização da cobertura

Dia 19 -21 de Março de 2013

Continuação da execução do elemento construído.



21-03-2013 Continuação do processo de impermeabilização da cobertura, colocação da tela



21-03-2013 Continuação do processo de formalização da cobertura, colocação do ripado

Dia 20 -22 de Março de 2013

Regularização e suavização de taludes para futura estabilização com espécies vegetais.
Continuação da limpeza global do espaço de intervenção.



25-03-2013 Regularização e suavização de taludes



25-03-2013 Regularização e suavização de taludes



25-03-2013 Vista da janela do Alojamento Lago(em construção)



25-03-2013 Vista da janela do Alojamento Lago(em construção) - Pormenor

Dia 21 -02 de Abril de 2013

Continuação dos trabalhos no elemento construído.



02-04-2013 Finalização da cobertura do elemento construído



02-04-2013 Finalização da cobertura do elemento construído



2-04-2013 Continuação da execução do elemento construído



2-04-2013 Continuação da execução do elemento construído
